

**SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y  
RESTAURACIÓN DE CAUCES  
ENERO-FEBRERO 2014**

**IBILGUEN MANTENTZE ETA  
BERRESKURATZE-  
ZERBITZUA  
URTARRILA-OTSAILA 2014**

**INFORME PARA LA COMISIÓN  
INTERISTITUCIONAL  
PARA LA PREVENCIÓN DE  
INUNDACIONES EN LA CUENCA  
DEL RIO URUMEA.**



## INDICE

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAUCES.....	2
ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA.....	3-13
Mapa de localización de las actuaciones.....	3
Resumen de las actuaciones realizadas en la cuenca del Urumea.....	4-6
Actuaciones realizadas en la cuenca del Urumea.....	7-13
Actuaciones singulares.....	7
Eliminación de Invasoras.....	7
Plantaciones.....	7
Mantenimiento.....	8
Imprevistos.....	8-13
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE CAUCES QUE SE HAN REGISTRADO EN LA AGENCIA VASCA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL URUMEA.....	14



## **1. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAUCES EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES**

El servicio de mantenimiento de cauces consiste básicamente en el mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces y márgenes de ríos y arroyos de la comunidad autónoma del País Vasco.

En la actualidad coexisten tres contratos similares, uno por cada territorio histórico.



Los principales trabajos que se llevan a cabo por este servicio son:

- Actuaciones singulares o proyectos
- Control y eliminación de plantas invasoras
- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones
- Actuaciones de mantenimiento programadas
- Imprevistos: Dentro de los imprevistos se contemplan los trabajos originados por las crecidas que puedan originarse.



## 2. ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA

### 2.1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

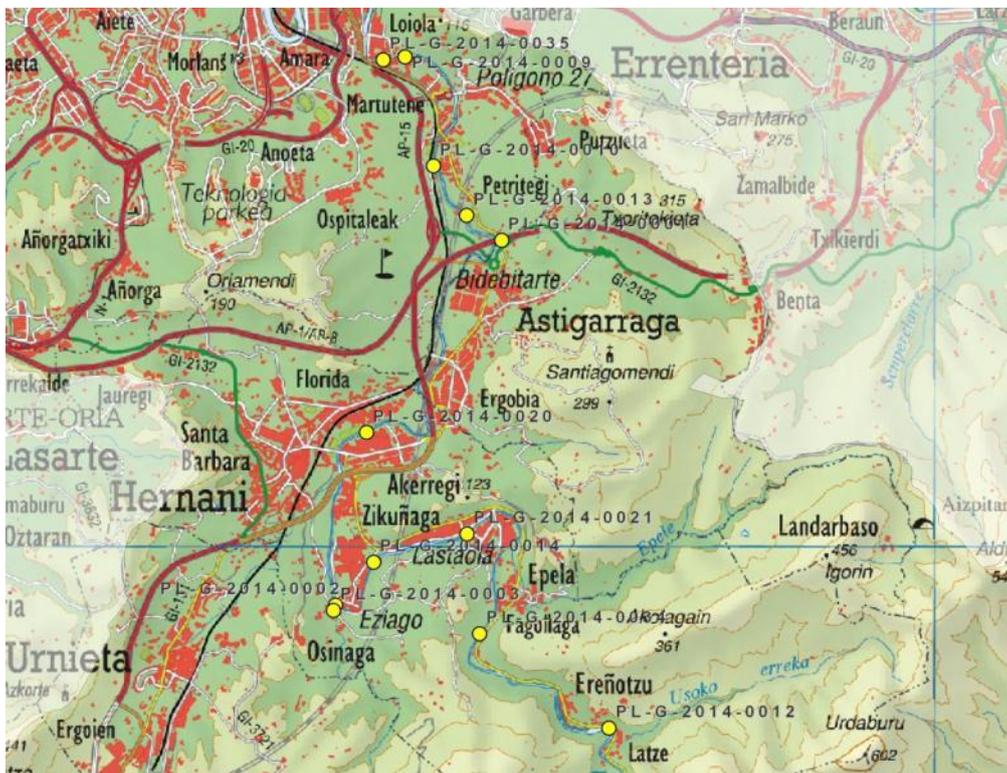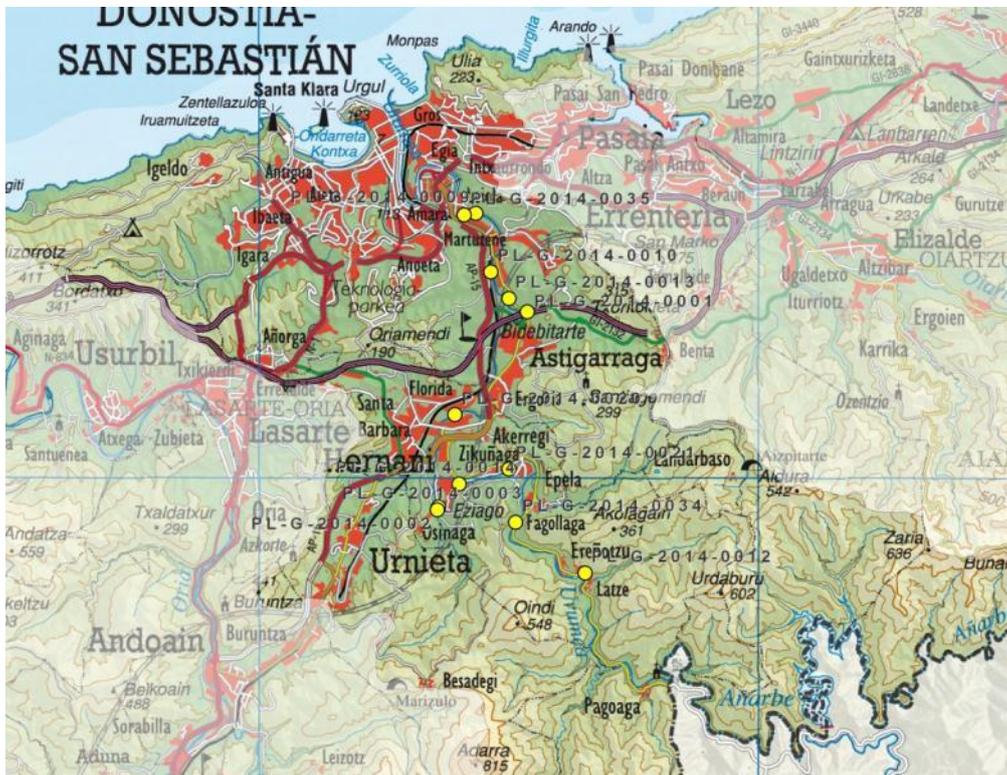




## 2.2 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA

### 2.2.1 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA POR TIPO DE ACTUACIÓN

	GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN EN LA CUENCA DE URUMEA		
	Nº de actuaciones	Coste	% coste total actuaciones
Actuaciones singulares	-	-	-
Control y eliminación de especies invasoras	1	3.000,00	10,59%
Plantaciones y mantenimiento de plantaciones	-	-	-
Mantenimiento programado	1	4.000,00	14,12%
Imprevistos	10	21.326,76	75,29%
<b>TOTAL</b>		<b>28.326,76</b>	<b>100%</b>

Porcentaje del gasto por cada tipo de actuación en la cuenca de Urumea

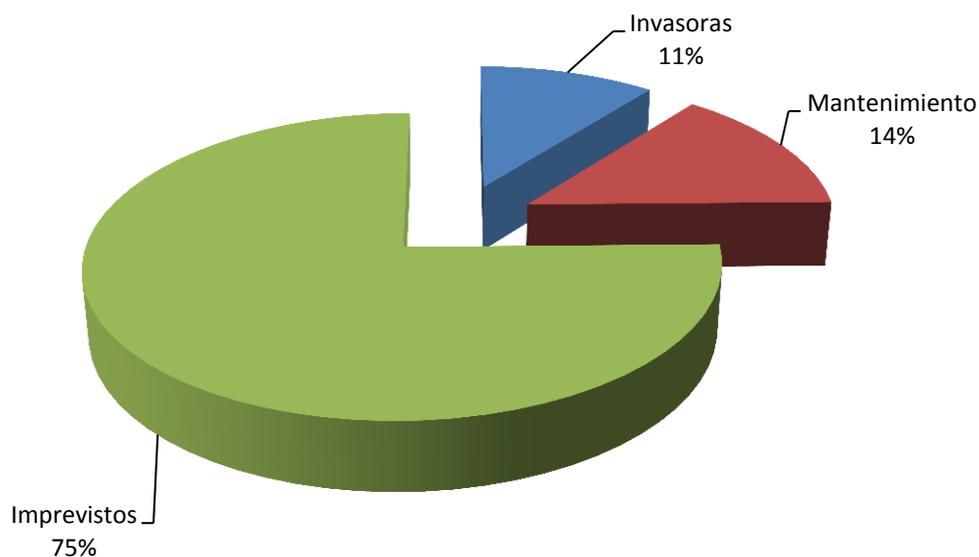



## 2.2.2 TABLA RESUMEN DE LAS ACUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA

TIPO DE ACTUACIÓN	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN
Control y eliminación de especies invasoras	PL-G-2014-0009	Donostia	Se desbroza la margen (zarzas, bambú, renutria, etc.) retirando las basuras que asoman tras la misma. Se deja la plantación autóctona de ribera.
Mantenimiento programado	PL-G-2014-0010	Donostia	Se desbrozan las márgenes dejando las especies de ribera autóctonas, en el ámbito de los dos estribos del puente. Se talan dos alisos secos en la margen izquierda.
Imprevistos	PL-G-2014-0001	Donostia	Se extraen varios árboles atascados en la desembocadura, tala de otras 3 con peligro de caída al cauce y poda de ramas de gran porte hacia el río. Se sacan desde la margen izquierda de Donostia
	PL-G-2014-0002	Hernani	Se extraen 3 acacias y un platanero.
	PL-G-2014-0003	Hernani	Se extrae el árbol cruzado.
	PL-G-2014-0012	Hernani	Se extrae árbol de 20 m de alto y 35 cm de diámetro, con ayuda de la Ertzaintza para regular el tráfico.
	PL-G-2014-0013	Donostia	Se ha extraído un platanero de grandes dimensiones caído al cauce, y talados otros dos con riesgo de caída al cauce.
	PL-G-2014-0014	Hernani	Se extrae árbol de 30 m de alto y 60 cm de diámetro
	PL-G-2014-0020	Hernani	Se extraen los tres árboles (1de Ø25cms* 8mts, 1de Ø22cms.*10mts, 1 de Ø45cms*9mts).
	PL-G-2014-0021	Hernani	Retirada de árbol grande caído junto al acceso de la papelera Ibarluze
	PL-G-2014-0034	Hernani	Caída al cauce de 20-25 árboles de porte mediano. Fagollaga. Se han sacado del río los siguientes ejemplares: 1*Ø27cms*15 metros, 1* Ø20cms.*7 metros, 1* Ø22 cms.*7 metros, 1* Ø26 cms* 10 metros, 1* Ø30 cms.*8 metros, 1* Ø20 cms*6 metros, 1* Ø14cms*10 metros, 1* Ø20cms*9 metros, 1* Ø12cms*6 metros, 2* Ø12cms*4 metros, 1* Ø22cms*8 metros, 1* Ø26cms*12 metros, 1* Ø23cms*12 metros, 1*



TIPO DE ACTUACIÓN	CÓDIGO DE ACTUACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN
			Ø20cms*12 metros, 1* Ø30cms*15 metros, 1* Ø65cms*5 metros, 1* Ø35cms*6 metros, 1* Ø18cms*8 metros, 1* Ø13cms*8metros, 1* Ø15cms*5metros, 1* Ø30cms*6metros, 1* Ø35cms*16metros, 1* Ø17cms* 12 metros, 1* Ø40cms*5 metros, 1* Ø20cms*10metros, 1* Ø20cms*4metros, 1* Ø25cms*5metros, 1 de Ø40cms*10metros.
	PL-G-2014-0035	Donostia	Se extrae árbol de 17 m de alto y 1,20 m de diámetro



## 2.3 ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA

### 2.3.1- Actuaciones singulares en la cuenca Urumea

**Importe total: 0 €**

### 2.3.2- Control y eliminación de especies invasoras en la cuenca Urumea

**Importe total: 3.000,00 €**

- *Código de la actuación: PL-G-2014-0009*

Se desbroza la margen (zarzas, bambú, renutria, etc.) retirando las basuras que asoman tras la misma. Se deja la plantación autóctona de ribera.

*Coste total de la actuación: 3.000,00 €*



### 2.3.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la cuenca Urumea

**Importe total: 0 €**



### 2.3.4- Mantenimiento programado en la cuenca Urumea

**Importe total: 4.000,00 €**

- *Código de la actuación: PL-G-2014-0010*

Se desbrozan las márgenes dejando las especies de ribera autóctonas, en el ámbito de los dos estribos del puente. Se talan dos alisos secos en la margen izquierda.

*Coste total de la actuación: 4.000,00 €*



### 2.3.5- Imprevistos en la cuenca Urumea

**Importe total: 21.326,76 €**

- *Código de la actuación: PL-G-2014-0001*

Se extraen varios árboles atascados en la desembocadura, tala de otros 3 con peligro de caída al cauce y poda de ramas de gran porte hacia el río. Se sacan desde la margen izquierda de Donostia.

*Coste total de la actuación: 6.125,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0002*  
Se extraen 3 acacias y un platanero.

*Coste total de la actuación: 1.592,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0003*  
Se extrae el árbol cruzado.

*Coste total de la actuación: 531,76 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0012*

Se extrae árbol de 20 m de alto y 35 cm de diámetro, con ayuda de la Ertzaintza para regular el tráfico.

*Coste total de la actuación: 825,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0013*

Se ha extraído un platanero de grandes dimensiones caído al cauce, y talados otros dos con riesgo de caída al cauce.

*Coste total de la actuación: 6.000,00 €*





- *Código de la actuación: PL-G-2014-0014*  
Se extrae árbol de 30 m de alto y 60 cm de diámetro.

*Coste total de la actuación: 1.000,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0020*  
Se extraen los tres árboles (1de Ø25cms\* 8mts, 1de Ø22cms.\*10mts, 1 de Ø45cms\*9mts).

*Coste total de la actuación: 855,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0021*  
Retirada de árbol grande caído junto al acceso de la papelera Ibarluze.

*Coste total de la actuación: 700,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0034*

Caída al cauce de 20-25 árboles de porte mediano. Fagollaga. Se han sacado del río los siguientes ejemplares: 1\*Ø27cms\*15 metros, 1\* Ø20cms.\*7 metros, 1\* Ø22 cms.\*7 metros, 1\* Ø26 cms\* 10 metros, 1\* Ø30 cms.\*8 metros, 1\* Ø20 cms\*6 metros, 1\* Ø14cms\*10 metros, 1\* Ø20cms\*9 metros, 1\* Ø12cms\*6 metros, 2\* Ø12cms\*4 metros, 1\* Ø22cms\*8 metros, 1\* Ø26cms\*12 metros, 1\* Ø23cms\*12 metros, 1\* Ø20cms\*12 metros, 1\* Ø30cms\*15 metros, 1\* Ø65cms\*5 metros, 1\* Ø35cms\*6 metros, 1\* Ø18cms\*8 metros, 1\* Ø13cms\*8metros, 1\* Ø15cms\*5metros, 1\* Ø30cms\*6metros, 1\* Ø35cms\*16metros, 1\* Ø17cms\* 12 metros, 1\* Ø40cms\*5 metros, 1\* Ø20cms\*10metros, 1\* Ø20cms\*4metros, 1\* Ø25cms\*5metros, 1 de Ø40cms\*10metros.

*Coste total de la actuación: 3.048,00 €*



- *Código de la actuación: PL-G-2014-0035*

Se extrae árbol de 17 m de alto y 1,20 m de diámetro.

*Coste total de la actuación: 650,00 €*





### **3. SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE CAUCES QUE SE HAN REGISTRADO EN LA AGENCIA VASCA DEL AGUA EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL URUMEA**

Durante los meses de enero y febrero de 2014 no se ha recibido por escrito ninguna solicitud de actuaciones de mantenimiento de cauces en la cuenca del Urumea. Todas las actuaciones han sido propuestas por el personal de inspección de la Agencia Vasca del Agua.
